Checkliste: Lichtkuppel – Sanierung mit VELUX Sanierungsrahmen

Objekt-Typ: _____ Adresse: _____
(z. B. Lagerhalle)

Anzahl Lichtkuppeln: _____ Stück ausgefüllt von: _____ Datum: _____

Schritt 1: Abmessungen Bestandslichtkuppel

Vorhandene Dachneigung _____ ° (zugelassener Dachneigungsbereich 0° bis 15°)

☐ Fremdhersteller oder ☐ Bauseitige Unterkonstruktion

Welches Fremdprodukt / Hersteller?? (wenn bekannt) _____

Auflagenbreite _____ mm

Es wird eine Auflagefläche von mindestens 50 mm benötigt.

Aussenmass (Aussenkante) H / W _____ / _____ mm

Eine Höhe von mindestens 150 mm wird benötigt.

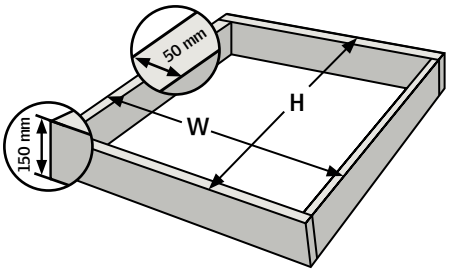

Schritt 2: VELUX Sanierungskranz

Bitte ermitteln Sie die passende Größe mit Hilfe der Abmessungen in der Tabelle.
Artikelnummer für Größe 100 x 100 z. B. ZCJ 100100 0000

ZCJ 0000	H mm	W mm
060060	490 – 520	490 – 520
080080	690 – 720	690 – 720
090090	790 – 820	790 – 820
100100	890 – 920	890 – 920
120120	1090 – 1120	1090 – 1120

Bestellgrösse VELUX Sanierungskranz _____ x _____ cm

Hinweis:
Ein zusätzliches Basiselement wird nicht benötigt. Der Sanierungskranz wird direkt auf die vorhandene Unterkonstrukion geschraubt.

Schritt 3: Auswahl Abdeckhaube

☐ Kunststoffhaube, Acryl, 2-schalig, matt
ISJ 0102

☐ Kunststoffhaube, Acryl, 3-schalig, matt
ISJ 0103

Schritt 4: Optional – Lüfterrahmen zur Nachrüstung ZCJ 1210

Lieferumfang: 230 V Motor*, Lüfterrahmen und Montageset.

☐ ja Bestellgrösse (siehe Schritt 2) Auswählen

☐ nein

Hinweis: Bitte entnehmen Sie die Preisinformationen zu den einzelnen Produkten aus den aktuellen Verkaufsunterlagen.

*Ansteuerbar über gängige Schalterprogramme (Wandschalter nicht im Lieferumfang enthalten).

Stand: April 2021
Technische Änderungen vorbehalten.
